

令和7年度地域防災緊急整備型避難所環境改善事業 福祉避難所備蓄倉庫購入

購入物品 仕様書のとおり

納入期限 令和9年2月26日 金曜日

納入場所 ①鷺敷地区 ふるさと那賀 那賀町中山とふめん18番地7
 ②鷺敷地区 ケアホーム鷺敷 那賀町和食郷字八幡原444
 ③上那賀地区 緑風会チロル 那賀町成瀬字小谷口2番地
 ④木頭地区 あめごの里 那賀町木頭和無田字イワツシ1番地

		個 数	単 位	単 価	金 額	規 格・寸 法	備 考
1	本体費	1	式			仕様書メーカー品 もしくは同等品 オプション品含む	別紙仕様書記載
2	基礎工事費	1	式			基礎ブロック9～25個 各普通作業員0.5日×2人 雑材料費含む	基礎工事として アンカー工事含 む
3	組立費	1	式			標準組立経費	
4	諸経費	1	式			輸送費含む	
	小計						
	消費税	10	%				
	合計						

令和7年度地域防災緊急整備型避難所環境改善事業 福祉避難所備蓄倉庫購入 仕様書

購入物資	下記内訳のとおり		
納入期限	令和9年2月26日	金曜日	
納入場所	①鷺敷地区	ふるさと那賀	那賀町中山とふめん18番地7
	②鷺敷地区	ケアホーム鷺敷	那賀町和食郷字八幡原444
	③上那賀地区	緑風会チロル	那賀町成瀬字小谷口2番地
	④木頭地区	あめごの里	那賀町木頭和無田字イワツシ1番地

メーカー	寸法(mm)	床面積	備考
① イナバ物置	W1,880×D1,880×H2,270	約 3.53 m ²	SMK-36SN 結露軽減材、棚Aセット含む
② イナバ物置	W3,040×D1,880×H2,440	約 5.72 m ²	SMK-58HN 結露軽減材、棚Aセット含む
③ イナバ物置	W5,260×D2,210×H2,385	約 11.62 m ²	FB-5222H 結露軽減材付屋根、棚Eセット含む
④ イナバ物置	W1,790×D1,530×H2,085	約 2.74 m ²	FL-1815SL(基本棟+追加棟1棟) 雨とい、結露軽減材付屋根、耐風・耐震補強A・Eセット含む
もしくは貴社取扱上記各同等品			

- 1 組み立ては現地にて行う。周辺に組み立てを阻害する樹木は無し。
- 2 設置場所の基礎についてはブロック塀等で調整するほか、適正なアンカー工事を行うこと。
- 3 ④の設置場所は碎石と土であるため、それらを撤去したうえで適正な基礎工事を行うこと。
- 4 上記メーカー以外(同等品)を使用する場合は前もって図面等の提出を行うこと。
- 5 設置する1週間以上前に、担当者に納入場所及び設置予定日時について連絡すること。

令和7年度地域防災緊急整備型避難所環境改善事業 福祉避難所備蓄倉庫購入

		ふるさと那賀	ケアホーム鷺敷	チロル	あめごの里	合計
1	本体費					
2	基礎工事費					
3	標準組立費					
4	結露軽減材					
5	棚セット					
6	雨とい					
7	耐風・耐震補強A・Eセット					
8	諸経費					
	小計					
	消費税(10%)					
	合計					

扉の位置は変えられます

SMK-36SN **スタンダード**

①ふるさと那賀



別売棚Aセット及び結露軽減材も組み立てること

ブロック別途:9個

開口寸法:幅1090mm 高さ1798mm/製品重量:約332kg

床面積:3.53m²(1.07坪)

扉の位置は変えられます

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はハイルーフ



ブロック別途：16個

棚板・棚支柱はオプション

スタンダード 開口寸法：幅1090mm 高さ1798mm／製品重量：約461kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1090mm 高さ1798mm／製品重量：約496kg

床面積：
5.72㎡ (1.73坪)

SMK-58HN **ハイルーフ**

②ケアホーム驚敷

別売棚Aセット及び結露軽減材も組み立てること

HS

写真はPS色

FB-5222H

ハイルーフ



換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。[側面は除く])

※豪雪型の扉はSF-4Hとなり開口幅は954mmとなります。

開口寸法: 幅1236mm 高さ2023mm/製品重量: 約675kg

ガラス窓 (GF-3H)はオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

床面積:11.62㎡(3.52坪)

③緑風会チロル

別売棚Eセット及び結露軽減材付屋根も組み立てること


④あめごの里



写真はEB色布基礎仕様

FL-1815SL

組立費別途

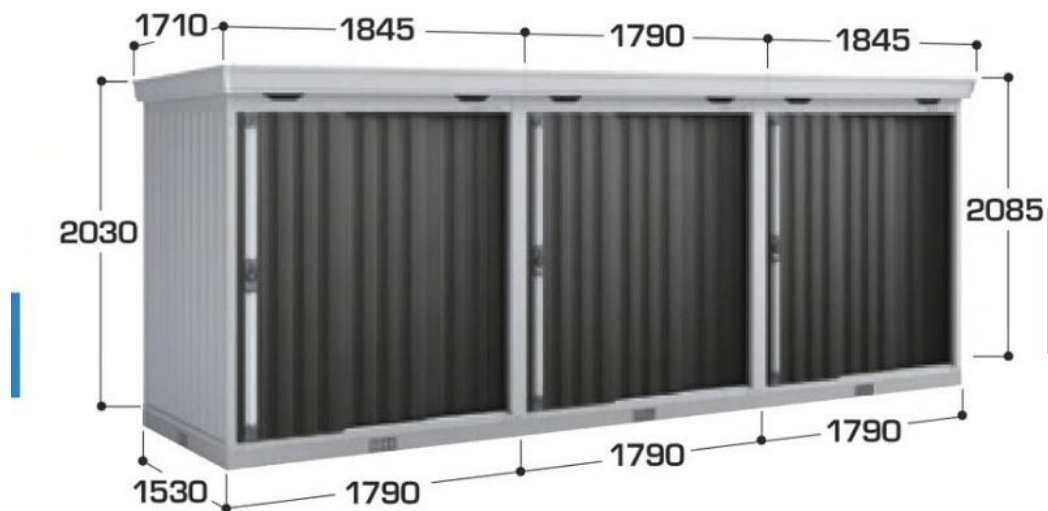

※一般型において基本棟と追加棟の2棟建てとし、結露軽減材付屋根及び屋根、耐風・耐震補強セットをそれぞれに組み立てること

開口寸法：幅954mm 高さ1770mm

床面積：2.74㎡(0.83坪)×連続数

①ふるさと那賀



社会福祉法人緑風会 介護老人福祉施設 ふるさと那賀

介護施設・

概要

基本情報



ルート・乗換



保存



付近を検索



モバイルデバイスに送信




共有

〒771-5204 徳島県那賀郡那賀町中山とふめん18-7

営業中・営業終了: 17:00

kenshokai.group

0884-62-0082

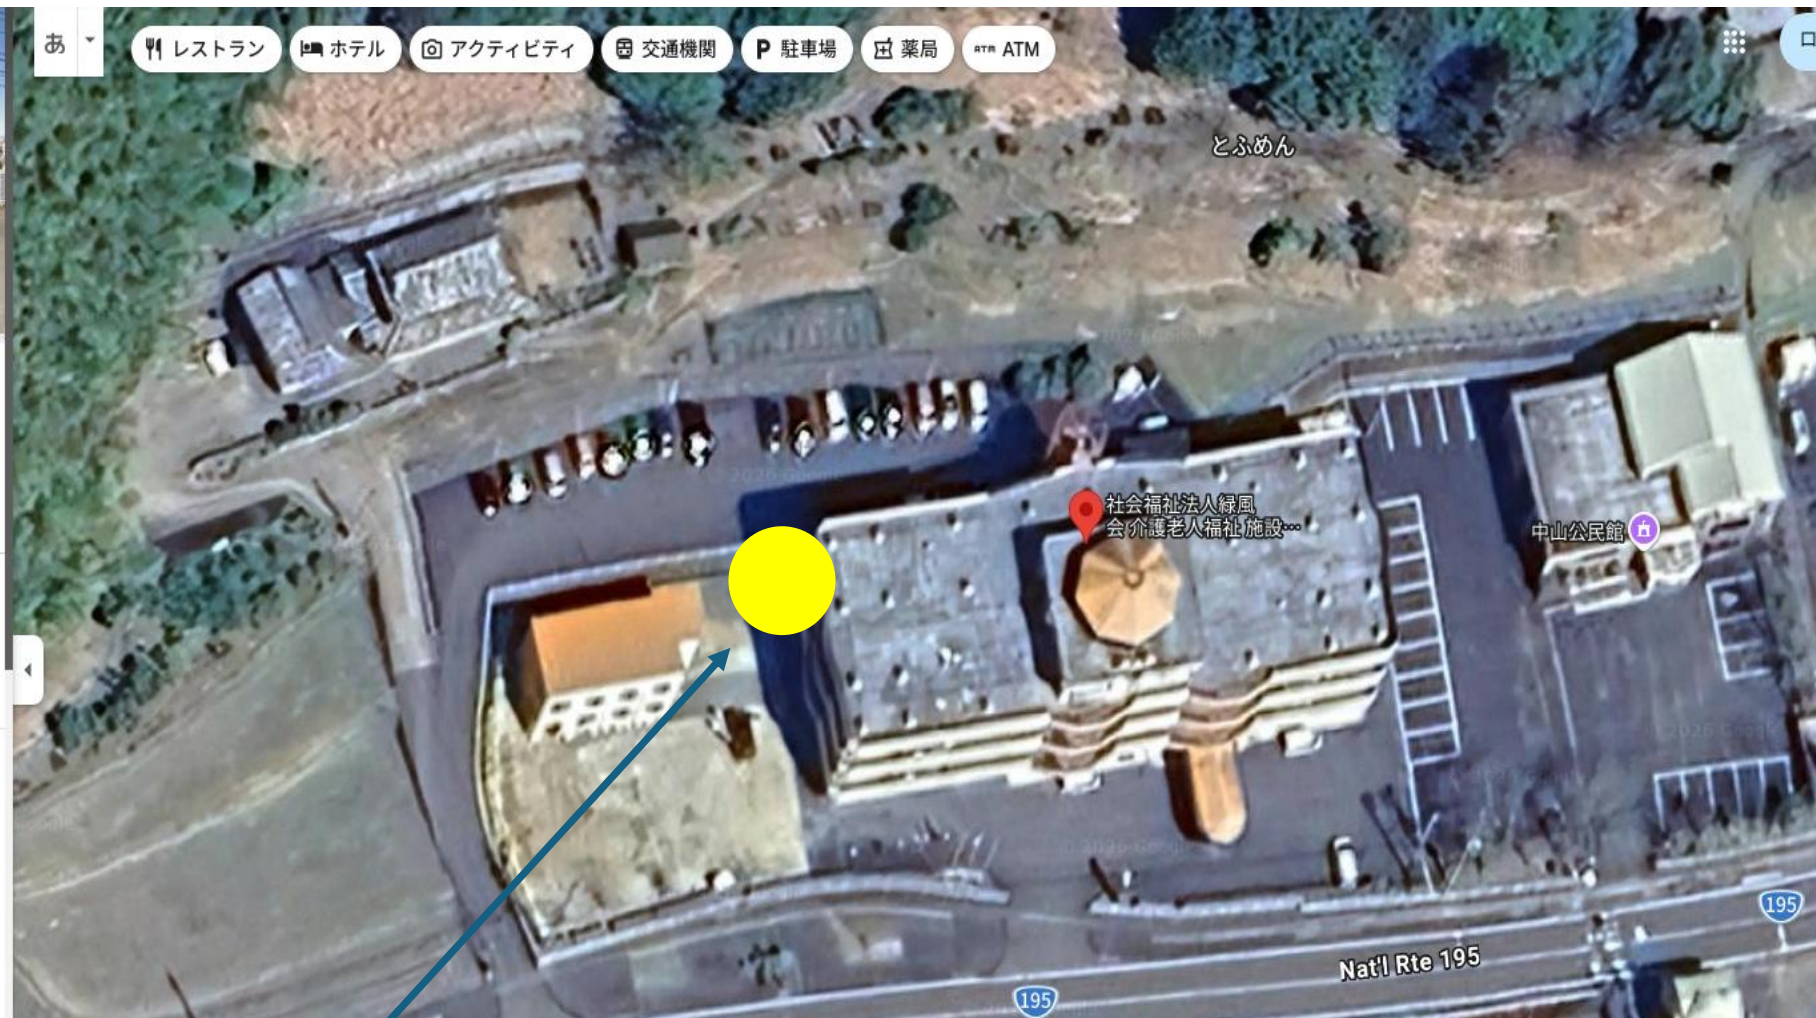

設置場所

①ふるさと那賀 現地写真



※倉庫設置時には残置物はありません

①ふるさと那賀 現地写真



※倉庫設置時には残置物はありません

②ケアホーム驚敷



介護老人保健施設 ケアホーム驚敷

介護施設・

概要

基本情報



〒771-5203 徳島県那賀郡那賀町和食郷南川4 4

営業中・営業終了: 17:00

wajiki.rouken.jp

0884-62-1500



②ケアホーム驚敷 現地写真



②ケアホーム驚敷 現地写真



③緑風会チロル

社会福祉法人緑風会 特別養護老人ホーム 緑風会チロル

5.0 ★★★★★ (1)
老人ホーム・♿

概要 クチコミ 基本情報

ルート・乗換 保存 付近を検索 モバイルデバイスに送信 共有

〒771-6326 徳島県那賀郡那賀町成瀬2

営業中・営業終了: 17:00

kenshokai.group

0884-67-0888



③緑風会チロル

※現在は足場は設置していないため、既存倉庫の横に設置すること



③緑風会チロル

※現在は足場は設置していないため、既存倉庫の横に設置すること

④あめごの里



④あめごの里



※設置場所は砂利と土があるため、それらを撤去したうえで適正な基礎工事を行うこと。



※設置場所は砂利と土があるため、それらを撤去したうえで適正な基礎工事を行うこと。
