那賀町橋梁長寿命化修繕計画



令和 6 年 3 月

（令和 8 年 10 月更新）

那賀町
Naka-cho

～　目　次　～

那賀町の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・1

橋梁の健全度評価・・・・・・・・・・・・・・・4

アセットマネジメント・・・・・・・・・・・・・7

橋梁長寿命化修繕計画策定・・・・・・・・・・・9










那賀町の現状


那賀町の橋梁

- 橋長 14.5m 以上の橋梁
- 道路や橋梁といった施設は、地域住民の生活に密着した最も基本的な社会基盤施設です。
- 那賀町が管理している橋長 14.5m 以上の橋梁は 99 橋あり、総延長は 4,130m になります。

橋梁数別・延長別に見ると、鋼橋が約 7 割を占め、次いで RC 橋が多くなっています。
那賀町はその大部分が山岳地形であり、急峻な地形が多く、現地条件は厳しい状況にあります。
このため、トラス、アーチ、吊橋といった特殊な構造形式も多く採用されています。
現在、架設から 50 年以上経過している橋梁は 38 橋あり、全体の約 38%にあたります。

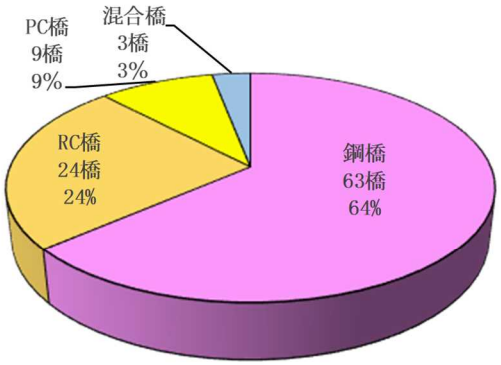


▲橋種別の橋梁数

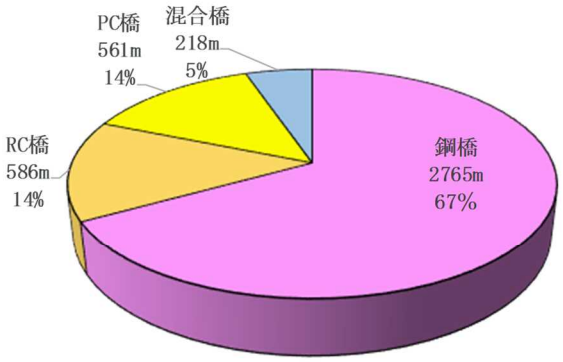


▲橋種別の橋梁延長

※RC橋:鉄筋コンクリート橋　PC橋:プレストレストコンクリート橋

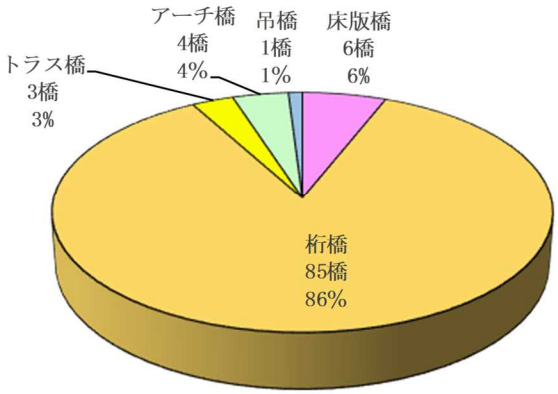


▲構造形式別の橋梁数

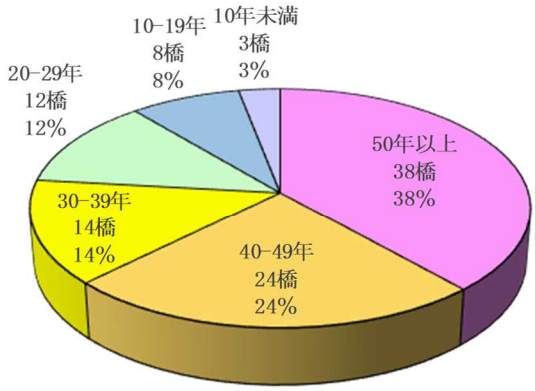


▲架設後の経過年数

橋長 14.5m 未満の橋梁

那賀町が管理している橋長 14.5m 未満の橋梁は 135 橋あり、総延長は 1,065m になります。
橋梁数別・延長別に見ると、RC が約 8 割を占め、次いで鋼橋が多くなっています。

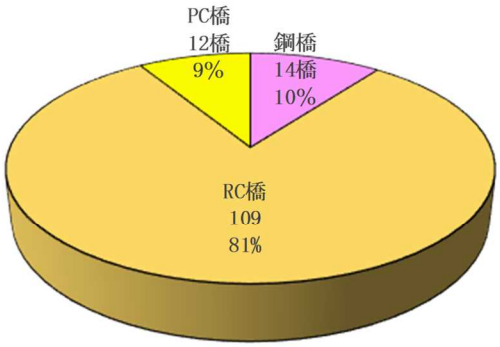


▲橋種別の橋梁数

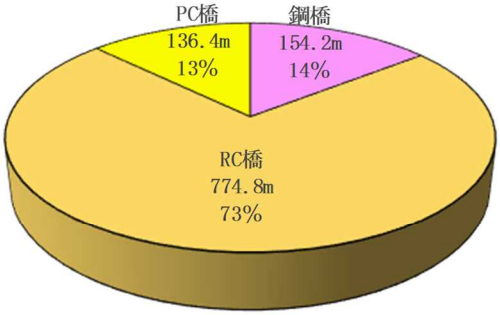


▲橋種別の橋梁延長

※RC橋:鉄筋コンクリート橋　PC橋:プレストレストコンクリート橋

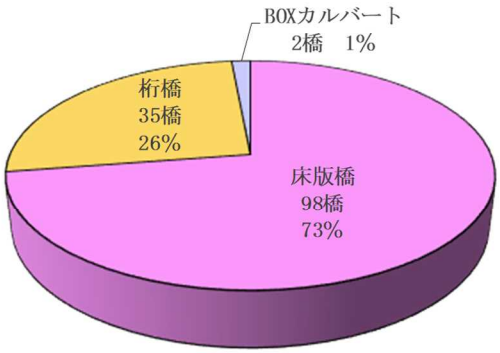


▲構造形式別の橋梁数

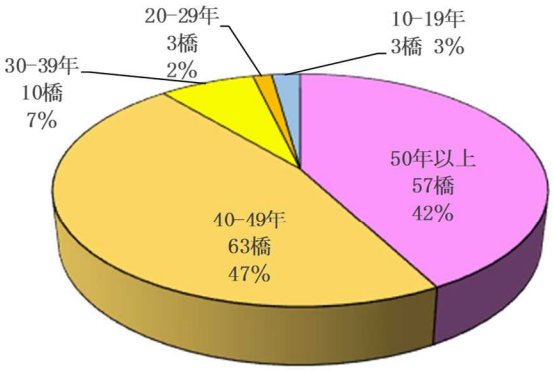


▲架設後の経過年数

高齢化する橋梁

- 橋長 14.5m 以上の橋梁全体の約 32%にあたる 76 橋が 1955～1972 年の高度経済成長期に架設されています。橋長 14.5m 未満の橋梁においても同様に高度経済成長期に架設された橋梁が多数存在しています。
- 今後はこれらの橋梁の高齢化が加速的に進むことになり、多額の修繕・架替費用が必要となってくることが予想されます。

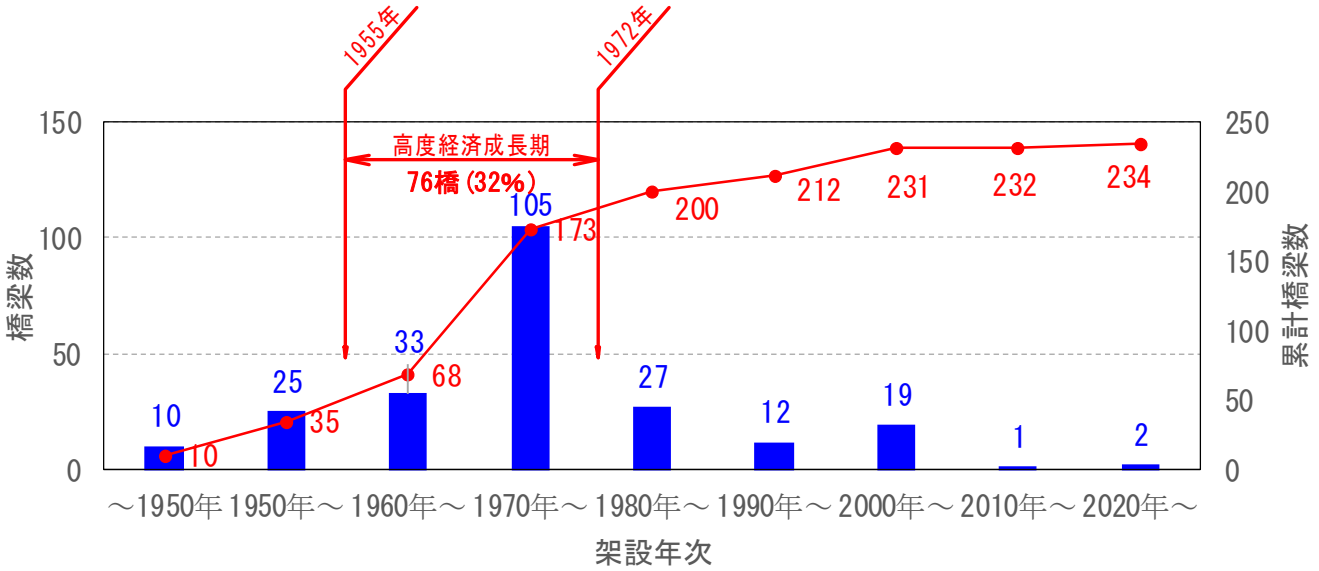

▲架設年次別の橋梁数

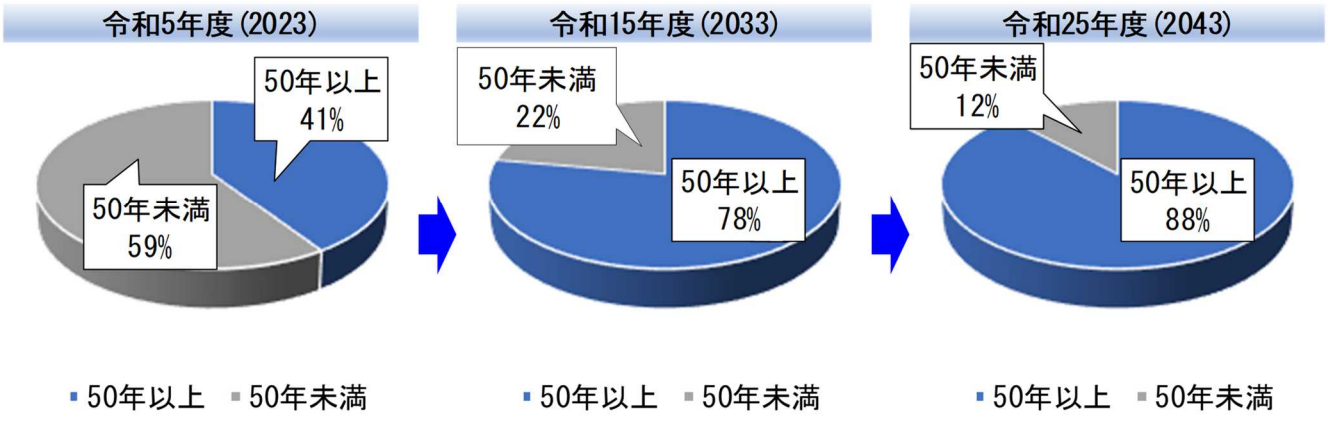


▲架設後の経過年数の推移

橋梁の健全度評価

橋梁点検

- 橋梁の異常・損傷をいち早く発見するために必要となるのが橋梁点検です。
- 点検により橋梁の状態を正確に把握し、情報を蓄積していきます。
- 那賀町の橋梁は主に通常点検と定期点検によって、橋梁の健全性を確認しています。

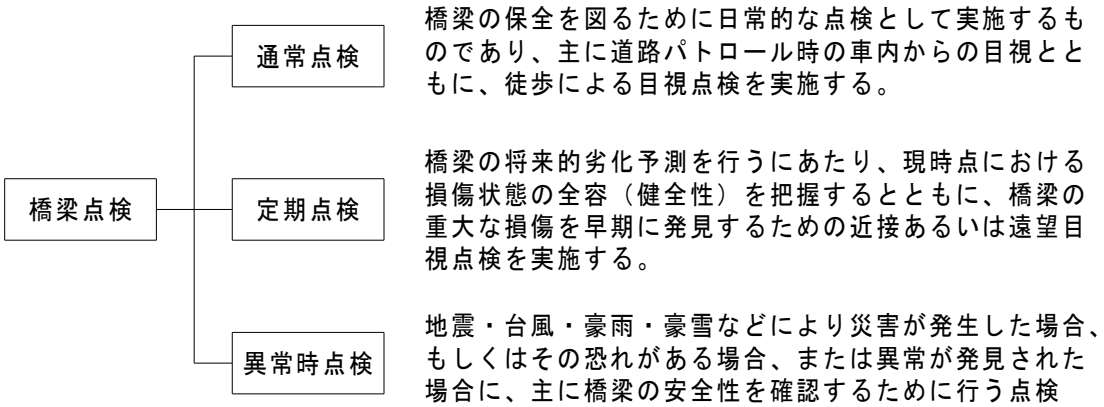

▲那賀町の橋梁点検の体系



写真１　橋梁点検車による点検



写真２　高所作業車による点検



写真３　ロープによる点検



写真４　梯子による点検

橋梁の損傷事例

- 損傷が発見された橋梁について、計画的かつ適切な対策を行うことで延命化が可能となります。
- 定期点検で健全度が低いと評価された橋梁については、早期の対策が必要となります。これらの橋梁については、優先的に段階的な補修等を実施し、健全度を回復させます。

●鋼橋の損傷事例



鋼桁の腐食



添接ボルトの脱落

●コンクリート橋の損傷事例



コンクリート桁の鉄筋露出




コンクリート床版のひびわれ

●その他の損傷事例



舗装面の段差

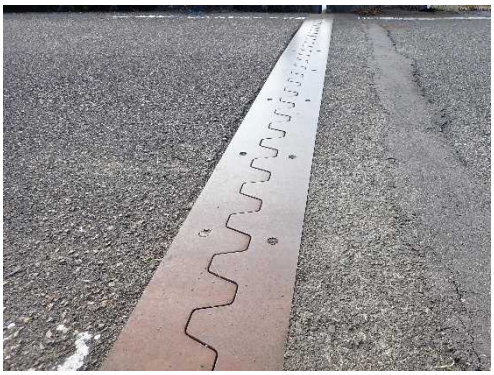

伸縮装置の遊間異常

管理橋梁の現状


定期点検では、対象の橋梁について損傷状況を確認し、道路橋定期点検要領（平成 31 年 2 月）に準じて、対象の橋梁部材毎及び対象の橋梁全体での健全性について診断を行い、以下のⅠ～Ⅳ段階の判定区分に分類します。

判定区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障を生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障を生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

- 橋長 14.5m 以上の橋梁

➢ 那賀町が管理する橋長 14.5m 以上の橋梁 99 橋の健全性は以下のとおりである。

判定区分	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	合計
橋梁数	14	71	14	0	99
割合（%）	14	72	14	0	100

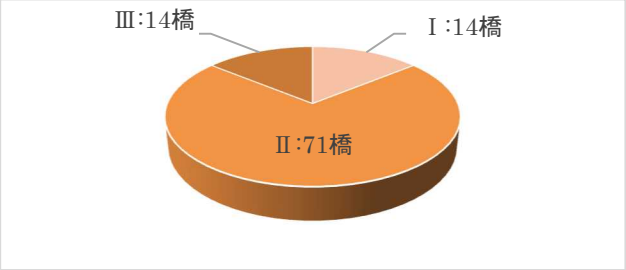


▲橋長 14.5m 以上の橋梁の判定区分結果

- 橋長 14.5m 未満の橋梁

➢ 那賀町が管理する橋長 14.5m 未満の橋梁 135 橋の健全性は以下のとおりである。

判定区分	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	合計
橋梁数	21	95	19	0	135
割合（%）	16	70	14	0	100

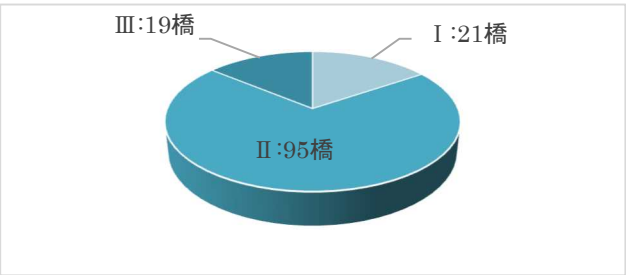

▲橋長 14.5m 未満の橋梁の判定区分結果

➢ 点検時には健全と判断された橋梁でも、今後の時間の経過とともに、損傷が進行することが考えられます。

アセットマネジメント

アセットマネジメントとは

- 地域住民にとって安全で快適な生活に欠かせない橋梁は、那賀町の共有財産です。
- 現在のような厳しい財政下において、安全性の確保と低コスト化を両立させるためには上手な資産運用が必要です。
- 人間の健康管理と同様に、橋梁諸元・点検結果・補修履歴等のデータを集積し、科学的知見を踏まえて計画的に維持管理を行うことにより、健全性・安全性を確保しつつ、長寿命化を図るのがアセットマネジメントです。

～　アセットマネジメントの考え方　～

1.点検
現在の橋梁の状態を正確に把握・評価

2.予測
今後の橋梁の状態がどうなるかを予測

3.検討
安全性と費用の面から最適な対策を検討

これまでの管理方法との違い


- 管理水準（対策を行う健全度）を明確にし、橋梁の健全性を持続的に確保していきます。
- 対症療法型から予防保全型への転換により、中長期（10ヶ年あるいは50ヶ年）的な視点で橋梁の長寿命化を図るとともに、適切な予算配分を行います。


従来の管理方法：対症療法型

これまでは橋梁の損傷がある程度進行してから対策を行っていたため、危険度や対策費用が増大する傾向にあり、橋梁の寿命も短くなっていました。

今後の管理方法：予防保全型

これからは損傷を早期発見しながら、橋梁の状態や立地条件に合わせた維持管理の方法や修繕の優先順位を検討し、計画的かつ適切な対策を行っていきます。

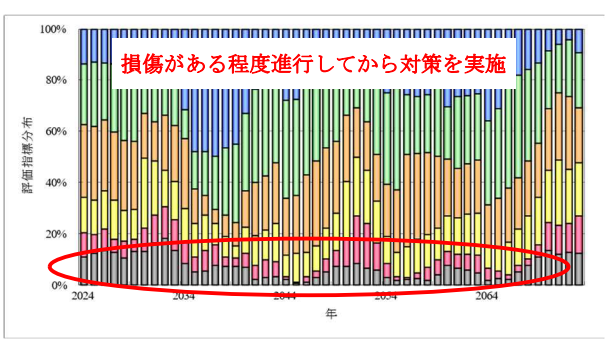


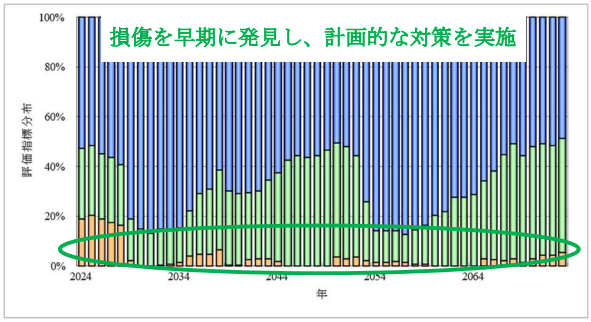


▲橋梁全体の評価指標（耐荷性）分布の推移：健全 危険

アセットマネジメントの導入効果

- 管理方法を効率化し、少ない費用で大きな効果を得るコスト管理ができます。
- 橋梁の破損・損傷を予防し、機能水準を確保しながら、健全性・安全性を向上させます。
- 論理的な説明根拠を基に予算配分を適正化します。
- 管理費を平準化することで急激な財政負担が緩和され、計画的な投資が可能となります。
- 維持管理事業のアカウンタビリティ（説明責任）を果たします。

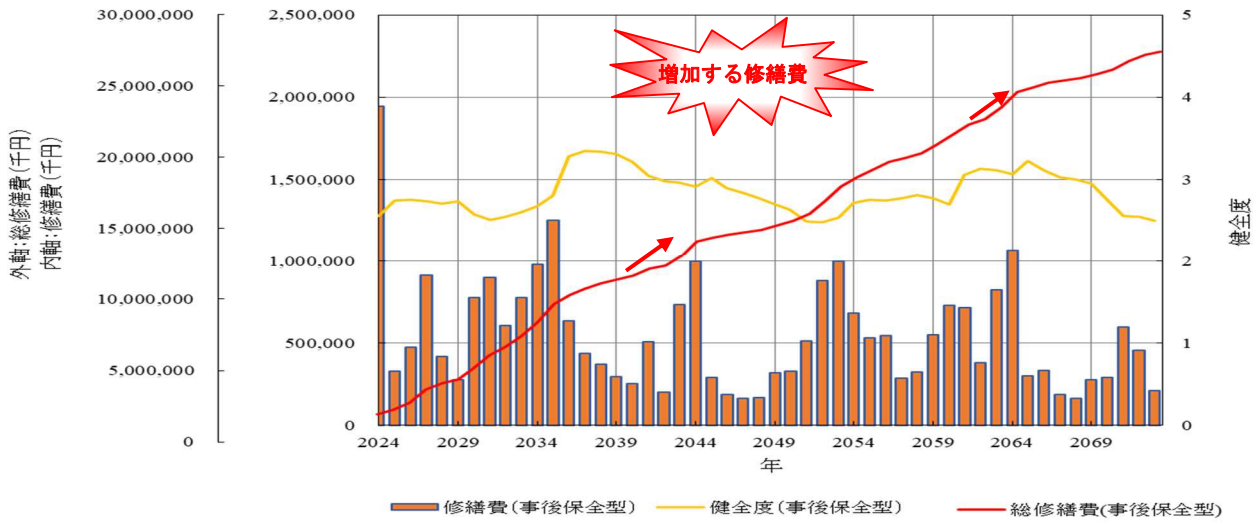

▲対症療法型：予算総額　約 273.9 億円

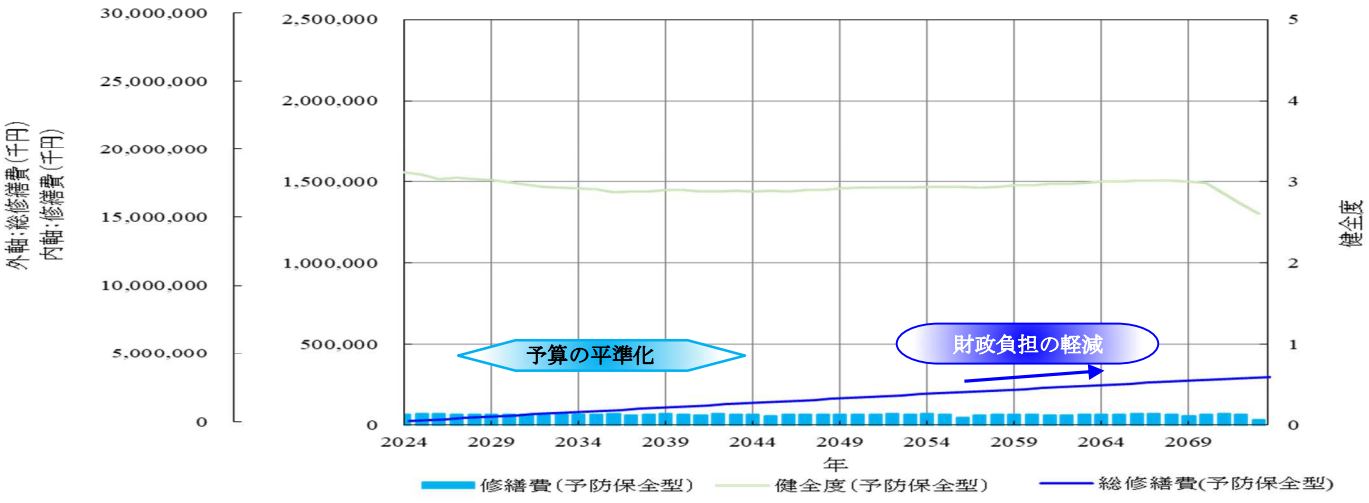

▲予防保全型：予算総額　約 32.5 億円


橋梁長寿命化修繕計画策定

橋梁長寿命化修繕計画策定の概要

- 橋梁の計画的な維持管理を実践的にすすめ、橋梁の機能を維持することにより、道路交通の安全性を確保します。
- 老朽化する橋梁の増大に対応するため、従来の維持管理から予防保全型の計画的な維持管理へと政策転換を図ります。
- 橋梁の長寿命化ならびに補修等の維持管理にかかる費用の縮減・平準化を図ります。

ライフサイクルコスト（LCC）

- 地域住民の共有財産である橋梁施設を効率よく維持管理するため、対象となるすべての橋梁の状態を把握・評価しながら中長期的な予測を行います。
- 予算制約下で、いつ・どこに・どのような対策を行うのが適切であるか検討し、計画的かつ効率的に管理するため、ライフサイクルコスト（LCC）の縮減を目指します。
- LCC とは新設から撤去まで、橋梁の一生の維持管理を行うために必要な費用のことです。
- 最適な段階で適切な対策を行うことにより、LCC を最小に抑えることができます。

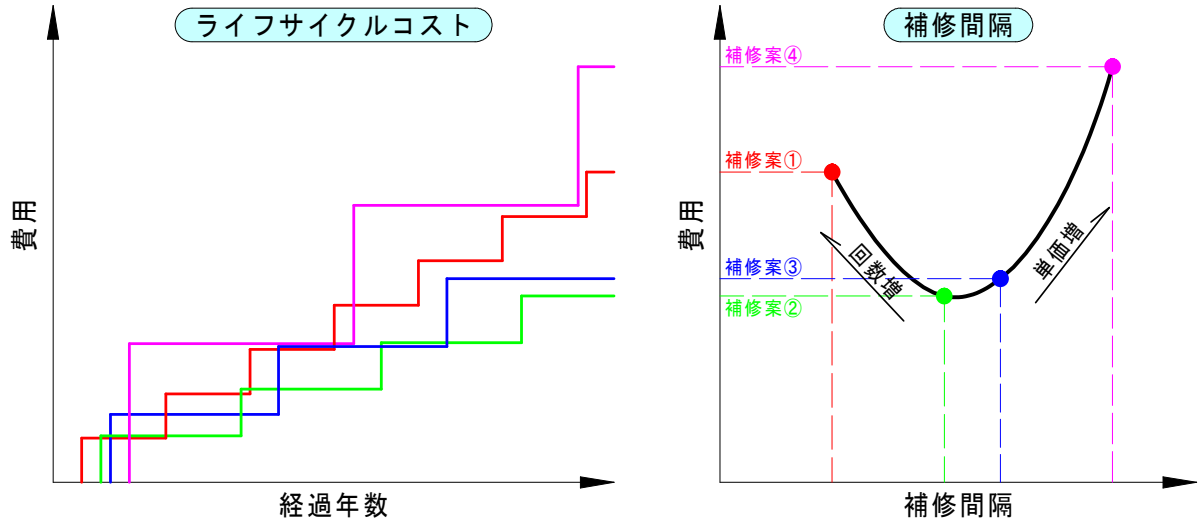

▲LCC と補修間隔の関係

事業の優先順位

- 橋梁の損傷度によって補修を行うことはもちろんですが、交差状況や添架物（水道管・電力など）の有無等も加味した優先順位を算出し、補修対策を実施します。

R6(2024)～R15(2033)

順位	通し番号	管理番号	橋梁名	路線名	橋長	全幅員	橋種	点検年	判定区分	架橋年次	橋長	路下条件	代替路	道路種別	緊急輸送道路	占用物件	諸元重要度	損傷重要度(耐荷性)	総合評価値	事業費（千円）										工法
																				R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
1	89	5020	出原谷橋	海川出原線	18.6	4.1	RC橋	R2	Ⅲ	1956	中小橋(1)	河川	有	1級町道		無	90	0	96	0	0	0	0	0	0	400	0	0	6,200	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，設計：設計費(R15)
2	163	3005	桧曽根橋	桧曽根線	12.4	3.7	鋼橋	R4	Ⅲ	1968	中小橋(2)	河川	無	その他		無	90	0	96	7,225	0	26,000	1,350	0	0	0	0	400	0	設計：設計費(R6)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R8,R9)，点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
3	175	3018	栗坂橋	拝宮谷線	6.8	3.9	鋼橋	R4	Ⅲ	1967	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	90	0	96	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
4	167	3010	西ノ谷橋	拝宮谷線	10.2	3.9	鋼橋	R4	Ⅲ	1965	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	87	0	94.8	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
5	53	3025	葛ヶ谷１号橋	葛ヶ谷線	14.5	3.9	RC橋	R7	Ⅲ	1974	中小橋(2)	河川	無	その他		無	85	0	94	7,225	550	300	10,000	0	0	400	0	0	0	設計：設計費(R6)，点検：定期点検(R7)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋脚：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R8,R9)，点検：定期点検(R12)
6	59	4006	大法縲橋	剣山線	26.5	5.5	鋼橋	R6	Ⅲ	1974	中小橋(1)	河川	無	その他		無	85	0	94	540	0	0	0	6,200	26,264	0	0	0	0	設計：設計費(R10)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R11)
7	87	5018	まきき橋	剣山線	20.4	4.3	鋼橋	R6	Ⅲ	1968	中小橋(1)	河川	無	その他		無	85	0	94	540	0	0	0	6,200	35,409	0	0	0	0	設計：設計費(R10)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　舗装：打換+床版防水　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R11)，点検：定期点検(R11)
8	94	5025	わるたに橋	剣山線	14.7	4.4	RC橋	R7	Ⅲ	1971	中小橋(2)	河川	無	その他		無	85	0	94	0	550	0	0	6,200	26,753	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，設計：設計費(R10)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
9	104	1005	千ヶ谷橋	北岸線	13.2	4.2	RC橋	R3	Ⅲ	1951	中小橋(2)	河川	有	その他		有	85	0	94	0	0	360	0	0	6,200	10,793	400	0	0	設計：点検：定期点検(R8)，設計：設計費(R11)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　舗装：打換+床版防水　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R13)
10	106	1007	才のの橋	小仁宇才のの線	11.2	4.7	RC橋	R3	Ⅲ	1956	中小橋(2)	河川	無	その他		有	85	0	94	0	0	360	42,000	50,000	50,000	10,000	400	0	0	点検：定期点検(R8)，設計：設計費(R9)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　橋脚：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10,R11,R12)，点検：定期点検(R13)
11	126	2002	王子橋	駅線	14.0	3.7	RC橋	R3	Ⅲ	1959	中小橋(2)	河川	有	その他		有	85	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R8.3.31供用廃止
12	206	5002	新九郎谷橋	剣山線	14.0	4.1	RC橋	R3	Ⅲ	1975	中小橋(2)	河川	無	その他		無	85	0	94	0	0	360	0	0	0	6,200	24,693	0	0	点検：定期点検(R8)，設計：設計費(R12)，点検：定期点検　主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
13	207	5003	第２関太郎橋	剣山線	10.4	5.5	鋼橋	R4	Ⅲ	1977	中小橋(2)	その他	無	その他		無	85	0	94	0	0	0	350	0	0	6,200	15,744	400	0	点検：定期点検(R9)，設計：設計費(R12)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　支承：支承防錆+足場工(始端側)　支承：支承防錆+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R14)
14	209	5005	黒土谷橋	剣山線	10.5	5.5	鋼橋	R3	Ⅲ	1974	中小橋(2)	河川	無	その他		無	85	0	94	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
15	215	5011	九文名橋	九文名線	8.4	6.8	RC橋	R3	Ⅲ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	85	0	94	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
16	32	3002	長安口吊橋	谷口線	147.1	3.2	鋼橋	R7	Ⅲ	1952	長大橋	河川	有	その他		無	80	0	92	0	550	0	0	0	0	400	6,200	20,446	21,560	[illegible]
17	88	5019	長者ヶ谷1号橋	出原谷・黒野田線	20.0	4.2	鋼橋	R6	Ⅲ	1984	中小橋(1)	河川	無	その他		無	80	0	92	7,765	0	0	0	0	33,400	5,000	0	0	0	設計：設計費(R6)，点検：定期点検(R11)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11,R12)
18	96	5027	屋治谷橋	上ミ屋治下モ屋地線	33.0	6.6	鋼橋	R7	Ⅲ	1961	中小橋(1)	河川	有	その他		無	80	0	92	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
19	130	2006	井ノ谷橋	井ノ谷蔭線	10.4	4.1	鋼橋	R3	Ⅲ	1975	中小橋(2)	河川	無	その他		無	80	0	92	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
20	192	4006	槍戸1号橋	槍戸線	9.0	4.0	RC橋	R4	Ⅲ	1957	中小橋(2)	河川	無	その他		無	80	0	92	0	0	0	9,350	10,000	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，設計：設計費(R9)，点検：定期点検(R14)
21	36	3007	上海川橋	海川出原線	35.8	5.0	鋼橋	R5	Ⅲ	1974	中小橋(1)	河川	有	1級町道		有	90	8	91.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
22	230	5026	月谷橋	月谷熊森線	4.5	3.7	RC橋	R5	Ⅲ	不明(1975)	中小橋(2)	河川	有	その他		無	85	8	89.2	0	0	0	0	400	0	10,197	0	0	400	点検：定期点検(R10)，設計：設計費　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R15)
23	29	2020	簗橋	簗百合谷線	171.0	2.4	鋼橋	R5	Ⅲ	1962	長大橋	河川	有	1級町道		無	85	16	84.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
24	77	5008	トゴエ橋	南宇拝ノ久線	35.9	4.0	RC橋	R5	Ⅲ	1972	中小橋(1)	河川	無	その他		有	90	20	84	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
25	132	2008	内山橋	内山線	9.5	3.2	RC橋	R4	Ⅲ	1976	中小橋(2)	河川	無	その他		無	85	20	82	8,500	2,000	0	350	0	0	0	0	400	0	主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　支承：支承防錆+足場工(始端側)　支承：支承防錆+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R6,R7)，点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
26	99	2022	かつら切橋	かつら切線	60.9	2.3	RC橋	R5	Ⅲ	1959	中小橋(1)	河川	無	その他		有	90	32	76.8	0	0	0	0	400	0	4,734	0	0	400	点検：定期点検(R10)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　床版：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋脚：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R15)
27	200	4016	西ノ谷橋	出羽2号線	5.4	4.3	RC橋	R4	Ⅱ	1977	中小橋(2)	不明	無	その他		無	87	32	75.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
28	2	1002	田野橋	和食田野線	181.0	8.2	PC橋	R5	Ⅱ	1988	長大橋	河川	有	1級町道	二次	有	32	0	72.8	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
29	41	3012	横畑橋	横畑線	27.7	4.2	鋼橋	R6	Ⅱ	1973	中小橋(1)	河川	無	2級町道		有	29	0	71.6	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
30	67	4014	寒谷橋	寒谷線	14.5	3.6	鋼橋	R7	Ⅲ	1965	中小橋(2)	河川	無	2級町道		有	29	0	71.6	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
31	35	3006	笹ノ瀬橋	海川ナカセ線	43.0	4.3	鋼橋	R6	Ⅱ	1975	中小橋(1)	河川	無	その他		有	27	0	70.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
32	101	1002	下北2号橋	下北線	13.5	4.3	鋼橋	R3	Ⅱ	1985	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	0	70.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
33	103	1004	山盛橋	山盛上線	13.0	4.0	鋼橋	R3	Ⅱ	1979	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	0	70.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
34	111	1014	百合新野4号橋	百合谷新野線	8.2	5.7	RC橋	R4	Ⅱ	1968	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	27	0	70.8	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
35	54	4001	坂州橋	坂州追立線	60.8	4.1	鋼橋	R6	Ⅱ	1966	中小橋(1)	河川	有	2級町道		有	24	0	69.6	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
36	55	4002	名古ノ瀬橋	名古ノ瀬与沢線	47.8	4.8	鋼橋	R5	Ⅱ	1969	中小橋(1)	河川	有	2級町道		有	24	0	69.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
37	70	5001	助大橋	助陰線	100.7	3.8	鋼橋	R6	Ⅲ	1967	長大橋	河川	無	2級町道		有	24	0	69.6	540	0	0	0	8,000	400	0	0	0	0	橋脚：断面修復(R10)，点検：定期点検(R11)　※判定区分変更(R8)
38	107	1008	下北1号橋	下北線	10.6	4.0	PC橋	R3	Ⅱ	1985	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	2	69.6	0	0	360	0	0	0	0	400	6,200	9,933	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)，設計：設計費(R14)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R15)
39	143	2020	雄高橋	奥谷線	7.0	7.1	RC橋	R5	Ⅲ	1945	中小橋(2)	河川	有	その他		有	90	44	69.6	7,756	0	3,000	15,000	400	0	0	0	0	400	設計：設計費(R6)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　伸縮装置：取替(R8,R9)点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
40	194	4008	阿津江1号橋	木頭名阿津江線	8.1	5.6	RC橋	R3	Ⅱ	1971	中小橋(2)	河川	無	2級町道		無	24	0	69.6	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
41	4	1004	新こかじや橋	新こかじや線	20.5	3.7	鋼橋	R6	Ⅱ	1981	中小橋(1)	河川	有	その他		有	22	0	68.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
42	5	1005	新田橋	新田線	20.5	3.7	鋼橋	R6	Ⅱ	1979	中小橋(1)	河川	有	その他		有	22	0	68.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
43	51	3023	カシ谷１号橋	カシ谷線	15.5	4.7	RC橋	R7	Ⅱ	1974	中小橋(1)	河川	有	その他		無	22	0	68.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
44	52	3024	井ノ谷１号橋	井ノ谷線	14.6	4.0	RC橋	R7	Ⅱ	1970	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	0	68.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
45	57	4004	飛石橋	鎗戸線	32.0	4.5	鋼橋	R6	Ⅱ	1977	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	0	68.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
46	66	4013	槍戸橋	槍戸線	17.0	4.0	RC橋	R7	Ⅱ	1959	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	0	68.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
47	79	5010	藤八橋	剣山線	30.5	5.5	鋼橋	R4	Ⅱ	1974	中小橋(1)	その他	無	その他		無	22	0	68.8	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
48	86	5017	船谷橋	船谷橋線	25.0	7.1	鋼橋	R6	Ⅱ	1962	中小橋(1)	河川	有	その他		有	22	0	68.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
49	92	5023	中谷４号橋	中谷線	15.5	4.2	RC橋	R7	Ⅱ	1970	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	0	68.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
50	95	5026	蝉谷２号橋	蝉谷線	14.5	4.4	RC橋	R7	Ⅱ	1970	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	0	68.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
51	97	5027	立輪谷橋	上ミ屋治下モ屋地線	18.0	6.2	鋼橋	R7	Ⅱ	1959	中小橋(1)	河川	有	その他		無	22	0	68.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
52	108	1009	北地二区内１号橋	北地二区内線	10.0	3.5	RC橋	R4	Ⅱ	1979	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	0	68.8	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
53	116	1019	昭和橋	仁宇神社線	6.2	3.6	RC橋	R3	Ⅱ	1938	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	0	68.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
54	136	2013	高橋	横石線	8.3	8.0	RC橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	22	0	68.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
55	159	3001	カドヶ谷1号橋	カドヶ谷線	13.6	3.7	RC橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	無	その他		有	22	0	68.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
56	188	4001	新居田橋	新居田線	13.3	7.0	RC橋	R3	Ⅱ	1957	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	0	68.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
57	210	5006	マタダイ橋	剣山線	10.0	4.4	RC橋	R3	Ⅱ	1968	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	0	68.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
58	224	5020	チョウシ谷1号橋	チョウシ谷線	6.0	4.1	RC橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	0	68.8	0	0	360	0	0	0	6,200	3,916	0	0	点検：定期点検(R8)，設計：設計費(R12)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工(R13)，点検：定期点検(R13)
59	12	2003	下雄大橋	段所線	99.8	6.0	鋼橋	R5	Ⅱ	1974	中小橋(1)	河川	無	1級町道		有	27	4	68.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
60	28	2019	下雄小橋	段所線	14.5	6.0	鋼橋	R7	Ⅰ	1974	中小橋(2)	河川	無	1級町道		有	20	0	68	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
61	190	4004	中谷橋	槍戸線	10.0	4.3	RC橋	R4	Ⅲ	1958	中小橋(2)	その他	無	その他		無	80	40	68	0	0	0	9,350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，設計：設計費(R9)，点検：定期点検(R14)
62	11	2002	蔭谷橋	蔭谷線	108.0	4.6	鋼橋	R5	Ⅱ	1964	長大橋	河川	無	2級町道		無	19	0	67.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
63	91	5022	西宇橋	西宇線	17.0	4.6	鋼橋	R7	Ⅱ	1963	中小橋(1)	河川	有	2級町道		無	19	0	67.6	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
64	93	5024	西ノ谷橋	西宇線	15.0	3.4	RC橋	R7	Ⅱ	1972	中小橋(1)	河川	有	2級町道		無	19	0	67.6	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
65	145	2023	三好橋	中山線	6.0	5.4	RC橋	R3	Ⅱ	1957	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	22	2	67.6	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
66	1	1001	細渕橋	百合百合谷線	215.5	13.8	PC橋	R6	Ⅱ	2003	長大橋	河川	有	1級町道		有	18	0	67.2	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
67	33	3003	水崎大橋	水崎線	99.0	6.0	鋼橋	R5	Ⅱ	1981	中小橋(1)	河川	有	2級町道		有	24	4	67.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
68	42	3013	白石橋	オバナ廻り線	26.1	7.6	鋼橋	R6	Ⅱ	1959	中小橋(1)	河川	有	その他		無	17	0	66.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
69	81	5012	ヤスエ滝橋	拝ノ久線	31.0	4.0	鋼橋	R6	Ⅱ	1968	中小橋(1)	河川	無	その他		無	17	0	66.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
70	149	2027	森の下橋	入野線	5.3	4.5	RC橋	R3	Ⅱ	1963	中小橋(2)	河川	有	その他		有	17	0	66.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
71	189	4003	横尾橋	横尾線	10.4	6.0	鋼橋	R3	Ⅱ	1982	中小橋(2)	河川	無	その他		無	17	0	66.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
72	114	1017	仁宇阿井1号橋	仁宇阿井線	6.3	3.9	RC橋	R3	Ⅱ	1968	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	4	66.4	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
73	131	2007	蛭子橋	谷内鮎川線	10.1	5.6	RC橋	R5	Ⅱ	1966	中小橋(2)	河川	有	1級町道		有	27	8	66	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
74	19	2010	香加ノ津橋	香加ノ津線	26.9	4.7	RC橋	R5	Ⅱ	1982	中小橋(1)	河川	無	その他		有	27	10	64.8	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
75	58	4005	泉谷橋	名古ノ瀬与沢線	29.5	3.9	鋼橋	R6	Ⅰ	1978	中小橋(1)	河川	無	2級町道		有	24	8	64.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
76	21	2012	上平間橋	上平間線	25.0	4.7	RC橋	R5	Ⅱ	1979	中小橋(1)	河川	有	その他		無	17	4	64.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
77	78	5009	安ヶ谷橋	安ヶ谷線	33.7	4.7	鋼橋	R5	Ⅱ	1974	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	8	64	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
78	140	2017	大張谷橋	横石線	6.5	3.7	RC橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	22	8	64	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
79	154	2032	第２大久保向原橋	大久保向原線	4.4	5.0	RC橋	R5	Ⅱ	1968	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	8	64	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
80	112	1015	としさね1号橋	としさね下線	6.9	3.9	RC橋	R3	Ⅰ	1975	中小橋(2)	河川	無	その他		有	20	8	63.2	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
81	72	5003	出原橋	海川出原線	87.1	4.8	鋼橋	R5	Ⅱ	1972	中小橋(1)	河川	有	1級町道		有	27	16	61.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
82	166	3009	桧曽根１号橋	檜曽根線	10.6	4.7	RC橋	R4	Ⅱ	1985	中小橋(2)	その他	無	その他		無	22	14	60.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
83	39	3010	大戸小橋	出合大戸線	34.8	8.2	鋼橋(耐)	R6	Ⅰ	1999	中小橋(1)	河川	有	その他		無	1	0	60.4	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
84	10	2001	鎌瀬橋	南岸線	134.0	8.0	鋼橋	R5	Ⅲ	1990	長大橋	河川	有	1級町道		無	22	16	59.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
85	182	3025	野田橋	音谷正木谷線	5.3	3.5	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	16	59.2	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
86	9	1009	井の木根橋	井の木根線	15.1	5.0	鋼橋	R7	Ⅱ	1980	中小橋(1)	河川	無	その他		有	27	20	58.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
87	85	5016	平橋	剣山線	27.4	15.7	鋼橋(耐)	R5	Ⅱ	1997	中小橋(1)	河川	無	その他		無	13	12	58	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
88	65	4012	笹原橋	剣山線	18.4	5.6	鋼橋	R7	Ⅱ	1979	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	20	56.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
89	76	5007	南宇橋	南宇西宇線	62.7	4.0	鋼橋	R6	Ⅲ	1963	中小橋(1)	河川	有	1級町道		有	22	20	56.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
90	80	5011	奥高野瀬橋	剣山線	30.5	5.5	鋼橋	R6	Ⅱ	1973	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	20	56.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
91	117	1020	玉ノ木1号橋	玉ノ木線	3.9	6.9	RC橋	R3	Ⅱ	1976	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	20	56.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
92	179	3022	牛田橋	平谷大戸線	5.8	4.0	RC橋	R3	Ⅱ	1967	中小橋(2)	河川	無	その他		有	22	20	56.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
93	139	2016	井ノ口橋	上平野線	7.5	5.7	RC橋	R3	Ⅲ	1956	中小橋(2)	河川	有	その他		有	80	62	54.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
94	15	2006	澄口橋	南岸線	34.2	6.2	鋼橋(耐)	R6	Ⅰ	1991	中小橋(1)	河川	有	1級町道		無	22	24	54.4	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
95	16	2007	土佐田橋	南岸線	42.8	6.2	鋼橋	R5	Ⅱ	1977	中小橋(1)	河川	有	1級町道		無	22	24	54.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)

R6(2024)～R15(2033)

順位	通し番号	管理番号	橋梁名	路線名	橋長	全幅員	橋種	点検年	判定区分	架橋年次	橋長	路下条件	代替路	道路種別	緊急輸送道路	占用物件	諸元重要度	損傷重要度(耐荷性)	総合評価値	事業費（千円） R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	工法
96	18	2009	打出橋	舞ヶ谷下線	27.8	4.7	RC橋	R5	Ⅱ	1959	中小橋(1)	河川	有	その他		有	22	24	54.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
97	127	2003	谷内鮎川バイパス橋	谷内鮎川線	13.0	5.8	RC橋	R4	Ⅱ	1976	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	22	24	54.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
98	164	3007	窪田橋	窪田線	11.1	4.4	鋼橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	22	24	54.4	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
99	208	5004	関太郎橋	剣山線	10.4	5.5	鋼橋	R4	Ⅱ	1976	中小橋(2)	その他	無	その他		無	22	24	54.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
100	214	5010	第１上松笠橋	上松笠線	8.7	4.1	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	その他	無	その他		無	22	24	54.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
101	218	5014	中谷2号橋	中谷線	7.5	3.9	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	不明	無	その他		無	22	24	54.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
102	219	5015	中谷3号橋	中谷線	7.5	4.0	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	不明	無	その他		無	22	24	54.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
103	221	5017	イズムネ橋	イズムネ線	7.0	4.0	RC橋	R3	Ⅲ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		有	80	64	53.6	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
104	62	4009	肉渕橋	剣山線	19.5	5.6	鋼橋	R7	Ⅱ	1983	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	26	53.2	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
105	162	3004	拝宮口橋	拝宮口線	13.3	4.4	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	26	53.2	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
106	177	3020	下オリゴエ橋	十二弟子線	6.2	4.0	RC橋	R3	Ⅱ	1955	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	26	53.2	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
107	24	2015	妙法寺橋	下谷内線	21.0	3.6	RC橋	R6	Ⅱ	1973	中小橋(1)	河川	有	その他		有	22	28	52	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
108	115	1018	生杉2号橋	生杉線	5.7	3.5	RC橋	R4	Ⅱ	1973	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	32	51.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
109	120	1023	武市１号橋	武市線	5.2	3.2	RC橋	R4	Ⅱ	1968	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	32	51.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
110	153	2031	第１大久保向原橋	大久保向原線	4.4	4.5	RC橋	R5	Ⅱ	1968	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	32	51.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
111	185	3028	西分橋	拝宮谷線	4.1	4.0	RC橋	R5	Ⅱ	不明(1945)	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	27	32	51.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
112	47	3018	市宇白石2号橋	市宇白石線	22.0	3.8	鋼橋(耐)	R6	Ⅱ	1987	中小橋(1)	その他	無	その他		無	22	30	50.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
113	50	3022	成瀬向橋	成瀬向線	17.1	5.2	鋼橋(耐)	R7	Ⅱ	1984	中小橋(1)	河川	有	その他		無	22	30	50.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
114	211	5007	日和田橋	日和田線	9.2	4.4	RC橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	17	28	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R8.3.31供用廃止
115	27	2018	けやきのさこ橋	南岸線	15.0	6.2	鋼橋(耐)	R7	Ⅱ	2003	中小橋(1)	河川	有	1級町道		無	1	18	49.6	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
116	134	2011	第２井ノ谷橋	井ノ谷日浦線	9.1	4.1	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	その他	無	その他		無	22	32	49.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
117	137	2014	武田橋	大西谷線	7.5	4.1	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	その他	無	その他		有	22	32	49.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
118	34	3004	深森1号橋	深森線	53.2	4.5	鋼橋	R5	Ⅱ	1983	中小橋(1)	河川	無	その他		有	27	38	48	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
119	186	3029	上オリゴエ橋	十二弟子線	4.0	4.0	RC橋	R5	Ⅲ	1956	中小橋(2)	河川	有	その他		無	80	74	47.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
120	168	3011	御所谷2号橋	御所谷線	9.4	6.8	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	17	32	47.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
121	17	2008	鉢ヶ谷橋	南岸線	35.0	6.2	鋼橋(耐)	R6	Ⅰ	2000	中小橋(1)	河川	有	1級町道		無	13	30	47.2	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
122	125	2001	馬路橋	鷲敷相生線	14.1	5.7	PC橋	R5	Ⅱ	1973	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	22	36	47.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
123	43	3014	七々浦4号橋	水崎線	24.5	6.2	鋼橋(耐)	R6	Ⅱ	1998	中小橋(1)	その他	無	2級町道		無	10	30	46	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
124	68	4015	瀬津橋	瀬津線	44.8	4.0	鋼橋	R6	Ⅰ	1986	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	38	46	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
125	31	3001	大戸橋	大戸古屋線	172.0	8.0	鋼橋(耐)	R5	Ⅱ	1994	長大橋	河川	無	その他		有	18	36	45.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
126	148	2026	万福寺橋	延野寺前線	5.2	6.2	RC橋	R4	Ⅰ	1968	中小橋(2)	河川	有	その他		無	10	32	44.8	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
127	178	3021	下ノ内橋	下ノ内線	6.4	3.5	RC橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	22	40	44.8	0	0	0	0	0	0	0	400	6,200	614	点検：定期点検(R13)，設計：設計費(R14)，点検：定期点検　床版：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工(R15)
128	204	4020	寺谷橋	坂州寺谷線	4.4	8.1	RC橋	R5	Ⅱ	不明(1945)	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	40	44.8	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
129	156	2034	北浦谷橋	横石線	12.5	6.0	PC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	27	44	44.4	0	0	0	350	0	0	6,200	1,515	400	0	点検：定期点検(R9)，設計：設計(R12)，費橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R14)
130	102	1003	中谷橋	仁宇中谷線	10.7	4.7	PC橋	R4	Ⅱ	1958	中小橋(2)	河川	有	その他		無	80	80	44	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
131	38	3009	大殿橋	平谷大殿線	34.5	5.8	RC橋	R6	Ⅰ	1938	中小橋(1)	河川	有	その他		有	22	42	43.6	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
132	37	3008	七々浦3号橋	水崎線	35.0	6.2	鋼橋(耐)	R6	Ⅰ	2001	中小橋(1)	その他	無	2級町道		無	3	30	43.2	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
133	6	1006	すくの谷橋	祢木のの線	21.0	5.2	PC橋	R6	Ⅰ	2008	中小橋(1)	河川	有	その他		有	6	32	43.2	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
134	84	5015	久則谷橋	海川出原線	30.0	6.2	鋼橋(耐)	R6	Ⅰ	2007	中小橋(1)	河川	有	1級町道		有	11	36	42.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
135	75	5006	ホラガ谷２号橋	剣山線	64.7	5.1	RC橋	R6	Ⅱ	1971	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	44	42.4	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
136	128	2004	第２寺前線橋	延野日の地線	12.6	4.6	RC橋	R4	Ⅱ	1974	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	44	42.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
137	138	2015	第２万福寺橋	延野寺前線	7.6	4.8	RC橋	R4	Ⅱ	1970	中小橋(2)	河川	有	その他		無	22	44	42.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
138	144	2022	石原橋	横石線	4.8	4.3	RC橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	22	44	42.4	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
139	176	3019	正木谷橋	音谷正木谷線	6.8	3.3	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	44	42.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
140	180	3023	井ノ谷2号橋	菖蒲井ノ谷線	5.4	4.0	RC橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	44	42.4	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
141	187	3030	東尾1号橋	東尾線	6.4	4.6	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	その他	無	その他		無	22	44	42.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
142	217	5013	中谷１号橋	中谷線	7.6	4.0	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	不明	無	その他		無	22	44	42.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
143	228	5024	長者ヶ谷3号橋	出原谷黒野田線	5.0	4.0	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	22	44	42.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
144	229	5025	蝉谷１号橋	蝉谷１号線	4.6	5.0	RC橋	R5	Ⅱ	1970	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	44	42.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
145	109	1010	唐杉1号橋	唐杉線	9.2	5.0	RC橋	R4	Ⅱ	1985	中小橋(2)	河川	無	2級町道		有	29	50	41.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
146	113	1016	生杉1号橋	生杉線	6.3	4.8	RC橋	R4	Ⅰ	1973	中小橋(2)	河川	無	その他		有	20	44	41.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
147	170	3013	カシ谷2号橋	カシ谷線	8.5	3.7	RC橋	R3	Ⅰ	1975	中小橋(2)	河川	無	その他		無	20	44	41.6	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
148	119	1022	百合谷内1号橋	百合谷内線	5.1	3.2	RC橋	R4	Ⅱ	1956	中小橋(2)	河川	有	その他		無	27	50	40.8	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
149	198	4013	仁義1号橋	仁義線	5.3	13.3	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	17	44	40.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
150	197	4011	寒谷３号橋	寒谷線	7.5	5.9	鋼橋	R3	Ⅱ	1967	中小橋(2)	河川	無	2級町道		有	29	52	40.4	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
151	26	2017	相小橋	相生小学校線	15.1	14.3	PC橋	R7	Ⅰ	2002	中小橋(1)	河川	有	その他	二次	無	18	46	39.6	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
152	226	5022	第３上松笠橋	上松笠線	5.5	4.1	RC橋	R4	Ⅰ	1975	中小橋(2)	その他	無	その他		無	15	44	39.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
153	227	5023	第２上松笠橋	上松笠線	5.5	4.1	RC橋	R4	Ⅰ	1975	中小橋(2)	その他	無	その他		無	15	44	39.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
154	234	5030	第４上松笠橋	上松笠線	4.0	3.6	RC橋	R5	Ⅰ	不明(1975)	中小橋(2)	河川	無	その他		無	15	44	39.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
155	233	5029	大城１号橋	大城線	4.1	3.9	RC橋	R5	Ⅱ	不明(1975)	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	52	39.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
156	161	3003	追谷下橋	海川出原線	13.3	6.2	鋼橋(耐)	R4	Ⅱ	1985	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	22	50	38.8	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
157	205	5001	拍子ヶ谷橋	平野西宇線	14.3	6.2	鋼橋(耐)	R4	Ⅰ	1994	中小橋(2)	その他	有	その他		無	1	36	38.8	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
158	183	3026	林谷橋	林谷線	5.0	5.7	RC橋	R5	Ⅱ	1971	中小橋(2)	河川	無	2級町道		無	24	52	38.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
159	64	4011	寺内橋	寺内線	18.1	3.8	鋼橋(耐)	R7	Ⅲ	1984	中小橋(1)	河川	無	その他		有	85	94	37.6	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
160	213	5009	西ノ谷2号橋	西宇線	9.5	4.8	RC橋	R4	Ⅱ	2002	中小橋(2)	河川	有	2級町道		無	10	44	37.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
161	151	2029	第２蔭谷橋	蔭谷線	4.3	4.2	RC橋	R5	Ⅰ	不明(1964)	中小橋(2)	道路	無	2級町道		無	22	52	37.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
162	73	5004	ごろごうち橋	南宇西宇線	72.0	6.2	鋼橋(耐)	R5	Ⅱ	1991	中小橋(1)	河川	有	1級町道		有	27	56	37.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
163	98	4017	夏霧橋	夏切線	39.0	6.2	鋼橋(耐)	R5	Ⅱ	2000	中小橋(1)	河川	無	その他		有	18	50	37.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
164	155	2033	川島橋	請ノ谷川島２号線	4.2	3.6	RC橋	R5	Ⅱ	不明(1975)	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	56	37.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
165	157	2035	長野橋	横石線	11.1	6.0	PC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	1級町道		有	27	56	37.2	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
166	202	4018	寺谷2号橋	坂州寺谷線	5.0	4.1	RC橋	R3	Ⅱ	1972	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	56	37.2	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
167	22	2013	大国橋	谷内鮎川線	21.7	6.2	PC橋	R6	Ⅱ	1989	中小橋(1)	河川	有	1級町道		有	27	58	36	540	0	360	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
168	13	2004	横石橋	横石線	97.0	7.4	鋼橋	R5	Ⅱ	1980	中小橋(1)	河川	有	1級町道		無	22	56	35.2	0	0	360	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
169	122	1025	和食中央１号橋	和食中央線	4.3	6.2	RC橋	R5	Ⅱ	1971	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	56	35.2	0	0	360	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
170	129	2005	第３内山橋	内山線	10.5	3.4	RC橋	R4	Ⅱ	1976	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	56	35.2	0	0	0	350	0	6,200	934	0	400	0	点検：定期点検(R9)，設計：設計費(R11)，主部材：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　支承：支承防錆+足場工(始端側)　支承：支承防錆+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工(R12)，点検：定期点検(R14)
171	172	3015	岡橋	東尾線	7.0	3.9	RC橋	R3	Ⅱ	1972	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	56	35.2	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
172	203	4019	檜戸２号橋	檜戸線	4.7	5.0	RC橋	R5	Ⅰ	1959	中小橋(2)	河川	無	その他		無	10	48	35.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
173	223	5019	長者ヶ谷2号橋	出原谷黒野田線	6.3	3.7	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	22	56	35.2	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
174	225	5021	拝ノ久2号橋	南宇拝ノ久線	6.0	4.0	RC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	56	35.2	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
175	82	5013	ホラガ谷５号橋	剣山線	27.3	5.1	RC橋	R6	Ⅰ	1969	中小橋(1)	河川	無	その他		無	15	52	34.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
176	220	5016	白久2号橋	白久線	7.1	4.0	RC橋	R4	Ⅰ	1975	中小橋(2)	河川	無	その他		有	20	56	34.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
177	8	1008	北地新橋	北地新線	16.0	5.2	PC橋	R7	Ⅱ	1985	中小橋(1)	河川	無	その他		無	27	62	33.6	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
178	152	2030	谷口橋	平野谷口線	4.4	3.0	RC橋	R5	Ⅱ	不明(1945)	中小橋(2)	河川	有	その他		無	17	56	33.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
179	3	1003	川口橋	和食北地線	36.0	5.7	鋼橋	R5	Ⅱ	1972	中小橋(1)	河川	有	その他		有	22	60	32.8	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
180	61	4008	与沢橋	名古ノ瀬与沢線	20.0	4.8	RC橋	R6	Ⅱ	1999	中小橋(1)	河川	無	2級町道		無	10	52	32.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
181	110	1013	小原橋	小原線	7.3	9.4	RC橋	R3	Ⅱ	1987	中小橋(2)	河川	有	2級町道		有	24	62	32.4	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
182	121	1024	百合新野1号橋	百合谷新野線	4.7	3.2	RC橋	R4	Ⅱ	1971	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	27	64	32.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
183	124	1027	百合谷内２号橋	百合谷内線	2.8	3.6	RC橋	R5	Ⅰ	1971	中小橋(2)	河川	有	その他		無	15	56	32.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
184	133	2010	馬路会堂橋	馬路会堂線	9.5	3.6	RC橋	R5	Ⅰ	1945	中小橋(2)	河川	無	その他		有	15	56	32.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
185	142	2019	第２内山橋	内山線	6.4	4.0	RC橋	R4	Ⅰ	1976	中小橋(2)	河川	無	その他		無	15	56	32.4	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
186	146	2024	東浦橋	横石東浦線	5.6	3.3	RC橋	R5	Ⅰ	不明(1945)	中小橋(2)	河川	有	その他		有	15	56	32.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
187	181	3024	市宇白石１号橋	市宇白石線	5.0	3.7	RC橋	R4	Ⅱ	1985	中小橋(2)	その他	無	その他		無	22	62	31.6	0	0	0	350	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
188	195	4009	寒谷4号橋	寒谷線	7.6	6.3	RC橋	R3	Ⅰ	1985	中小橋(2)	河川	無	2級町道		有	22	62	31.6	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
189	191	4005	岩倉橋	岩倉線	9.4	4.9	RC橋	R3	Ⅱ	1962	中小橋(2)	河川	無	2級町道		無	24	64	31.2	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
190	123	1026	堂ヶ谷１号橋	堂ヶ谷線	4.3	3.3	RC橋	R5	Ⅰ	2004	中小橋(2)	河川	有	その他		有	11	56	30.8	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)

R6(2024)～R15(2033)

順位	通し番号	管理番号	橋梁名	路線名	橋長	全幅員	橋種	点検年	判定区分	架橋年次	橋長	路下条件	代替路	道路種別	緊急輸送道路	占用物件	諸元重要度	損傷重要度(耐荷性)	総合評価値	事業費（千円）								工法
																				R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
191	90	5021	ホラガ谷３号橋	剣山線	15.2	3.4	RC橋	R7	Ⅱ	1971	中小橋(1)	河川	無	その他		無	22	64	30.4	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
192	147	2025	三ツ合橋	谷内鮎川線	5.4	4.3	RC橋	R3	Ⅱ	1958	中小橋(2)	河川	有	1級町道		有	27	68	30	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
193	83	5014	2号橋	剣山線	28.0	7.5	鋼橋(耐)	R5	Ⅱ	2003	中小橋(1)	河川	無	その他		無	13	62	28	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
194	100	1001	北地二区東線１号橋	北地二区内線	13.7	3.8	PC橋	R4	Ⅱ	1982	中小橋(2)	河川	有	その他		有	22	68	28	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
195	212	5008	東谷3号橋	南宇線	9.4	3.7	PC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	22	68	28	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
196	173	3016	田ノ久保１号橋	音谷田ノ久保線	7.2	4.6	RC橋	R4	Ⅰ	1972	中小橋(2)	河川	無	その他		無	15	64	27.6	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
197	105	1006	北地新線１号橋	北地新線	12.5	5.2	PC橋	R4	Ⅱ	1985	中小橋(2)	河川	無	その他		無	27	74	26.4	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
198	141	2018	第２東浦橋	横石東浦線	6.6	3.3	RC橋	R4	Ⅰ	1975	中小橋(2)	その他	無	その他		無	10	64	25.6	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
199	20	2011	定道橋	定道線	26.0	4.7	RC橋	R5	Ⅰ	1976	中小橋(1)	河川	無	その他		無	15	68	25.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
200	174	3017	田ノ久保２号橋	音谷田ノ久保線	7.0	4.7	RC橋	R4	Ⅱ	1972	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	76	25.2	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
201	222	5018	大城2号橋	大城線	6.5	4.2	RC橋	R3	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		有	27	76	25.2	0	0	360	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
202	196	4010	沢谷小畠３号橋	沢谷小畠線	10.0	6.3	RC橋	R4	Ⅱ	2004	中小橋(2)	不明	有	その他		無	13	68	24.4	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
203	150	2028	西内山橋	西内山線	5.0	3.3	RC橋	R5	Ⅱ	不明(1945)	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	76	23.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
204	158	2036	中傍示橋	横石線	7.0	6.2	PC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	22	76	23.2	0	0	0	350	0	0	0	0	6,600	630	点検：定期点検(R9)，設計：設計費　点検：定期点検(R14)，橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
205	201	4017	蔭山2号橋	蔭山線	5.0	4.5	RC橋	R3	Ⅱ	1976	中小橋(2)	河川	無	その他		無	22	76	23.2	0	0	360	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
206	23	2014	新野村橋	新傍線	21.5	6.2	鋼橋(耐)	R5	Ⅱ	1993	中小橋(1)	河川	有	その他		無	8	68	22.4	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
207	63	4010	大奥谷橋	出羽線	25.0	6.2	鋼橋(耐)	R7	Ⅲ	2004	中小橋(1)	河川	無	1級町道		無	13	72	22	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
208	44	3015	春森桟道橋	出合大戸線	25.1	6.7	RC橋	R6	Ⅰ	1945	中小橋(1)	河川	無	その他		有	17	76	21.2	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
209	135	2012	第２下ノ地橋	横石東浦線	8.7	6.2	PC橋	R4	Ⅱ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	17	76	21.2	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
210	40	3011	七々浦1号橋	水崎線	30.5	6.2	鋼橋(耐)	R5	Ⅱ	1993	中小橋(1)	河川	無	2級町道		無	10	72	20.8	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
211	199	4015	大奥谷2号橋	出羽線	5.8	5.4	RC橋	R3	Ⅱ	1960	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	22	80	20.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
212	46	3017	出合橋	平谷川俣線	22.3	3.9	鋼橋	R6	Ⅱ	1956	中小橋(1)	河川	無	その他		有	27	84	20.4	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
213	232	5028	泉谷橋	泉谷線	4.3	4.2	RC橋	R5	Ⅱ	1978	中小橋(2)	河川	有	その他		無	29	88	18.8	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
214	49	3021	七々浦２号橋	水崎線	19.0	6.2	鋼橋(耐)	R6	Ⅰ	1992	中小橋(1)	その他	無	2級町道		無	3	72	18	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
215	118	1021	生杉4号橋	生杉線	5.3	4.8	RC橋	R4	Ⅱ	1976	中小橋(2)	河川	無	その他		有	27	88	18	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
216	184	3027	十二弟子谷橋	十二弟子線	4.5	4.5	RC橋	R5	Ⅱ	1956	中小橋(2)	河川	有	その他		無	17	82	17.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
217	193	4007	大用知1号橋	大用知線	12.6	7.7	PC橋	R4	Ⅱ	2004	中小橋(2)	その他	有	その他		無	8	76	17.6	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
218	169	3012	平谷橋	平谷大殿線	8.7	6.7	RC橋	R5	Ⅰ	1954	中小橋(2)	河川	有	その他		有	15	84	15.6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
219	56	4003	わり谷橋	大用知線	46.5	4.8	鋼橋(耐)	R6	Ⅰ	2006	中小橋(1)	河川	無	その他		無	13	84	14.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
220	60	4007	蔭山1号橋	蔭山線	20.3	4.3	PC橋	R6	Ⅰ	2005	中小橋(1)	河川	無	その他		無	13	84	14.8	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
221	69	4016	五倍木1号橋	五倍木線	17.1	4.8	鋼橋(耐)	R3	Ⅱ	2006	中小橋(1)	河川	無	その他		無	13	84	14.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
222	171	3014	オイ谷橋	海川ナツキリ線	8.5	4.1	RC橋	R3	Ⅱ	1979	中小橋(2)	河川	無	その他		有	17	88	14	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
223	216	5012	歩危橋	歩危線	8.0	2.8	RC橋	R4	Ⅰ	1975	中小橋(2)	河川	有	その他		無	15	88	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	点検：定期点検(R14)
224	48	3019	御所谷1号橋	御所谷線	20.0	4.4	RC橋	R6	Ⅰ	1956	中小橋(1)	河川	有	その他		有	22	94	12.4	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
225	160	3002	追谷上橋	海川出原線	13.5	6.2	PC橋	R4	Ⅱ	1985	中小橋(2)	河川	有	1級町道		無	22	94	12.4	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
226	71	5002	高ノ瀬1号橋	剣山線	94.0	5.6	鋼橋(耐)	R4	Ⅰ	2020	中小橋(1)	河川	無	その他		無	6	84	12	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
227	30	2021	第２馬路橋	馬路線	17.6	5.2	PC橋	R4	Ⅰ	1976	中小橋(1)	河川	有	その他		無	10	88	11.2	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
228	25	2016	戸丸橋	戸丸線	15.5	4.0	RC橋	R7	Ⅱ	1961	中小橋(1)	河川	無	その他		有	27	100	10.8	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
229	7	1007	南川橋	南川東線	30.5	7.0	鋼橋(耐)	－	Ⅰ	2000	中小橋(1)	河川	有	その他		無	15	94	9.6	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
230	45	3016	西橋	平谷川俣線	22.4	5.2	鋼橋(耐)	R5	Ⅰ	2015	中小橋(1)	河川	無	その他		有	11	92	9.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
231	165	3008	宮ヶ谷橋	平谷上ノ内線	11.0	4.9	RC橋	R3	Ⅱ	1961	中小橋(2)	河川	有	1級町道		有	22	100	8.8	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
232	231	5027	南宇１号橋	南宇線	4.5	3.6	RC橋	R5	Ⅱ	不明(1963)	中小橋(2)	河川	有	その他		無	17	100	6.8	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
233	74	5005	新蔭井橋	海川出原線	68.5	6.2	鋼橋(耐)	R5	Ⅱ	2005	中小橋(1)	河川	有	1級町道		無	13	100	5.2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
234	14	2005	鎌ン谷橋	南岸線	53.0	6.2	PC橋	R6	Ⅰ	2004	中小橋(1)	河川	有	1級町道		無	6	100	2.4	540	0	0	0	0	400	0	0	0	0	点検：定期点検(R11)
235	235	－	七浦線1号橋	七浦線	10.5	3.0	RC橋	R7	Ⅰ	2004	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
236	236	－	こかじや橋	田中線	11.7	3.6	鋼橋	R7	Ⅱ	1970	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
237	237	－	百合百合谷1号橋	百合百合谷線	9.0	6.0	RC橋	R7	Ⅱ	不明	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
238	238	－	殿谷橋	中山線	5.5	5.2	RC橋	R7	Ⅰ	不明	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
239	239	－	丈ヶ谷橋	丈ヶ谷線	14.5	3.6	鋼橋(耐)	R7	Ⅲ	2000	中小橋(2)	河川	無	2級町道		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
240	240	－	はらい川橋	出羽線	12.5	5.0	鋼橋(耐)	R7	Ⅰ	2010	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
241	241	－	中滝橋	出羽線	12.5	5.0	鋼橋(耐)	R7	Ⅰ	2010	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
242	242	－	五倍木3号橋	五倍木線	15.5	4.0	鋼橋(耐)	R7	Ⅰ	2006	中小橋(1)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
243	243	－	天神谷橋	平野西宇線	6.7	9.1	RC橋	R7	Ⅰ	不明	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
244	244	－	折宇谷口橋	折宇谷線	20.5	4.0	鋼橋(耐)	R7	Ⅰ	2010	中小橋(1)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
245	245	－	かげ橋	としさね上線	15.9	2.0	鋼橋	－	－	1979	中小橋(1)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
246	246	－	八幡原水井1号橋	八幡原水井線	7.0	6.5	RC橋	－	－	1977	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
247	247	－	鷲敷相生1号橋	鷲敷相生線	3.0	4.9	RC橋	－	－	不明	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
248	248	－	東原橋	下平野線	3.6	4.0	RC橋	－	－	1958	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
249	249	－	寺前橋	延野日の地線	5.6	5.0	RC橋	－	－	不明	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
250	250	－	第２北名橋	北名線	3.1	5.0	RC橋	－	－	不明	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
251	251	－	庵ノ岡橋	菖蒲谷線	3.6	5.0	RC橋	－	－	不明	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
252	252	－	市宇中村橋	市宇中村線	5.8	4.0	RC橋	－	－	2004	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
253	253	－	寒谷1号橋	寒谷線	8.2	7.4	RC橋	－	－	1989	中小橋(2)	河川	無	2級町道		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
254	254	－	沢谷小畠1号橋	沢谷小畠線	3.9	3.0	RC橋	－	－	1970	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
255	255	－	子薮橋	拝ノ久線	3.6	3.1	RC橋	－	－	不明	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	0	360	0	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
256	256	－	折宇橋	石畳線	32.0	5.5	鋼橋	R7	Ⅱ	1960	中小橋(1)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	550	0	0	0	0	400	0	0	0	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
257	257	－	第２榎谷橋	榎谷線	3.4	3.0	RC橋	－	－	1953	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
258	258	－	中川原橋	拝宮谷線	3.3	3.6	RC橋	－	－	不明	中小橋(2)	河川	無	1級町道		無	－	－	－	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
259	259	－	母林２号橋	母林線	11.6	3.0	鋼橋	－	－	不明	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
260	260	－	拝ノ久橋	拝ノ久線	3.3	3.7	RC橋	－	－	不明	中小橋(2)	河川	無	その他		無	－	－	－	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
